

新庁舎建設事業の進捗状況と今後の予定

千早赤阪村庁舎建設検討委員会

平成30年6月28日


<想定スケジュール>

※前回から変更なし:再掲

時期	29	H30 年度				H31 年度				H32 年度		以降	
	3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9		
新庁舎建設事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本設計等 ● 埋蔵文化財試掘 	(別館等撤去設計・ アスベスト調査・ 仮移転設計含む)		<ul style="list-style-type: none"> ◎ 開発許可不要の事前協議 ● 家屋調査(プレハブ周辺家屋) ● 引越し(別館・プレハブ) 	● 撤去工事(別館・プレハブ)	● 実施設計		(※開発許可不要と なるよう調整)	● 埋蔵文化財調査		● 新庁舎建設		<ul style="list-style-type: none"> ● 既存本館撤去工事 (H33.8~) ● 新庁舎供用開始 (H33.7以降)
									(※期間は想定)				
土地財産整理	●	地図訂正・筆界特定			●	●	大阪府との調整			◎ 境界明示・ 所有権確定			
							関係地権者との調整 (調整期間:未定)						

1. 埋蔵文化財試掘調査

埋蔵文化財
試掘調査場所
(凡例: ■)

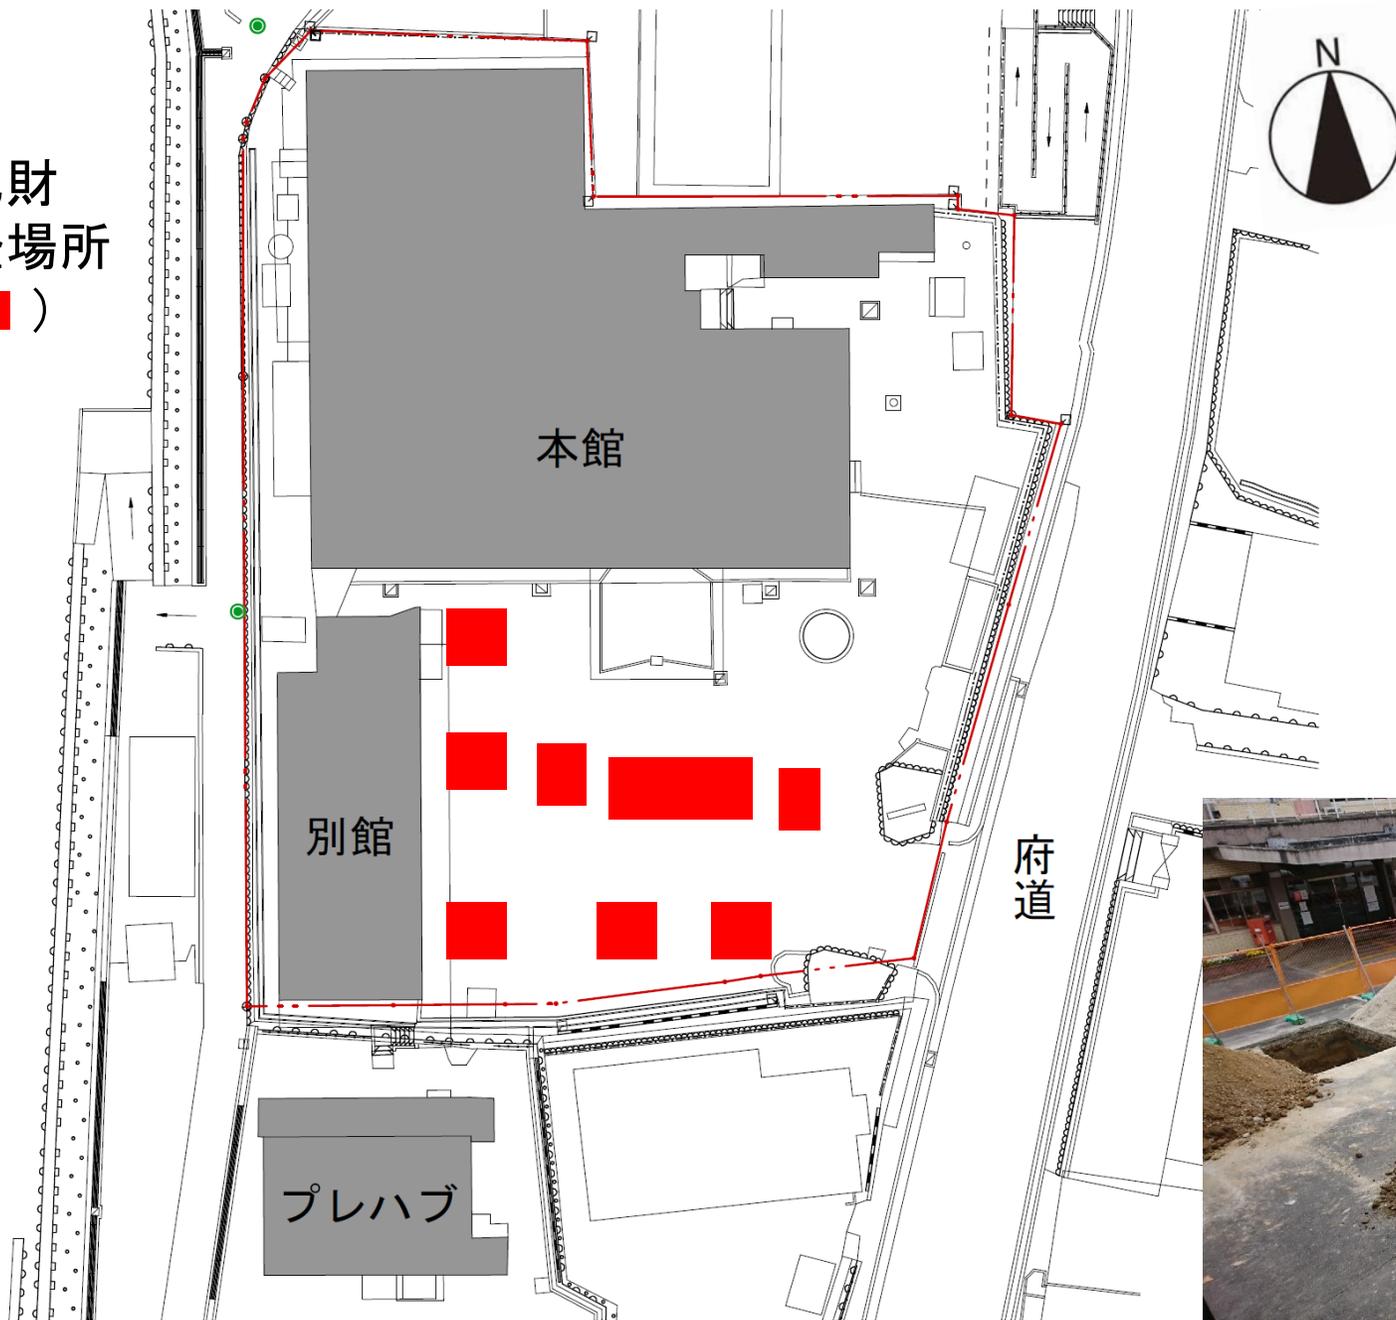


【発掘調査（試掘）の結果概要】

- 役場本館前の駐車スペースにおいて8カ所で発掘調査を実施した。
- 現庁舎建設以前の航空写真等で推測されたとおり、全カ所とも、舗装と路盤の直下層は田であった。
- 田の層下に関しては、北側の調査ポイントでは地山（自然地盤）と想定される面が確認された一方、南側のポイントでは遺物（土器片）が確認され、中世（13世紀頃）の層と推測された。



- 文化財担当にて全面発掘が必要と判断された。

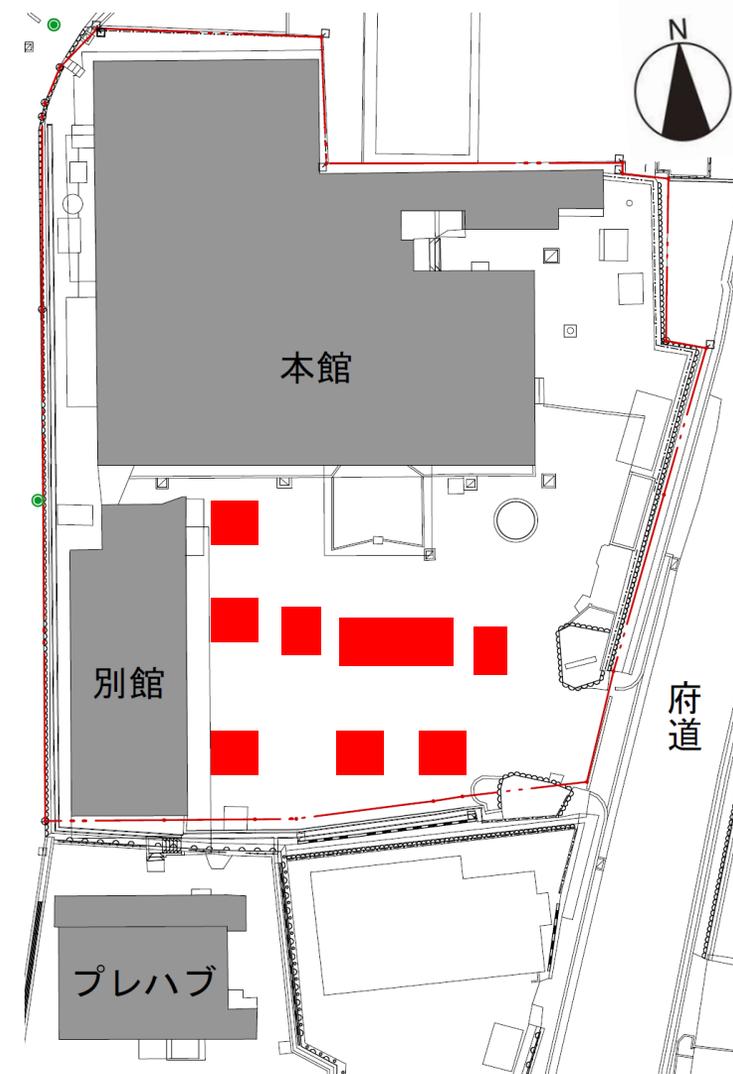

2. 建替工事転がし計画

3. 庁舎仮移転計画(案)

役場本館

